



Kanton Basel-Stadt

# **Sitzung Psychiatriekommission**

## **24. September 2020**

# **Aktueller Stand des Psychiatriekonzepts**

Regierungsrat Lukas Engelberger  
Vorsteher Gesundheitsdepartement Basel-Stadt  
Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK)

# Agenda

I Projektaufbau Psychiatriekonzept

II Gemeinsame Spitalliste «Psychiatrie»

III Projektplan + aktueller Stand

IV Fazit

# I Projektaufbau Psychatriekonzept


## Projektorganisation

Fachkommission GGR




# Fahrplan für die Versorgungsplanung GGR

## Versorgungsplanung 2020 - 2030

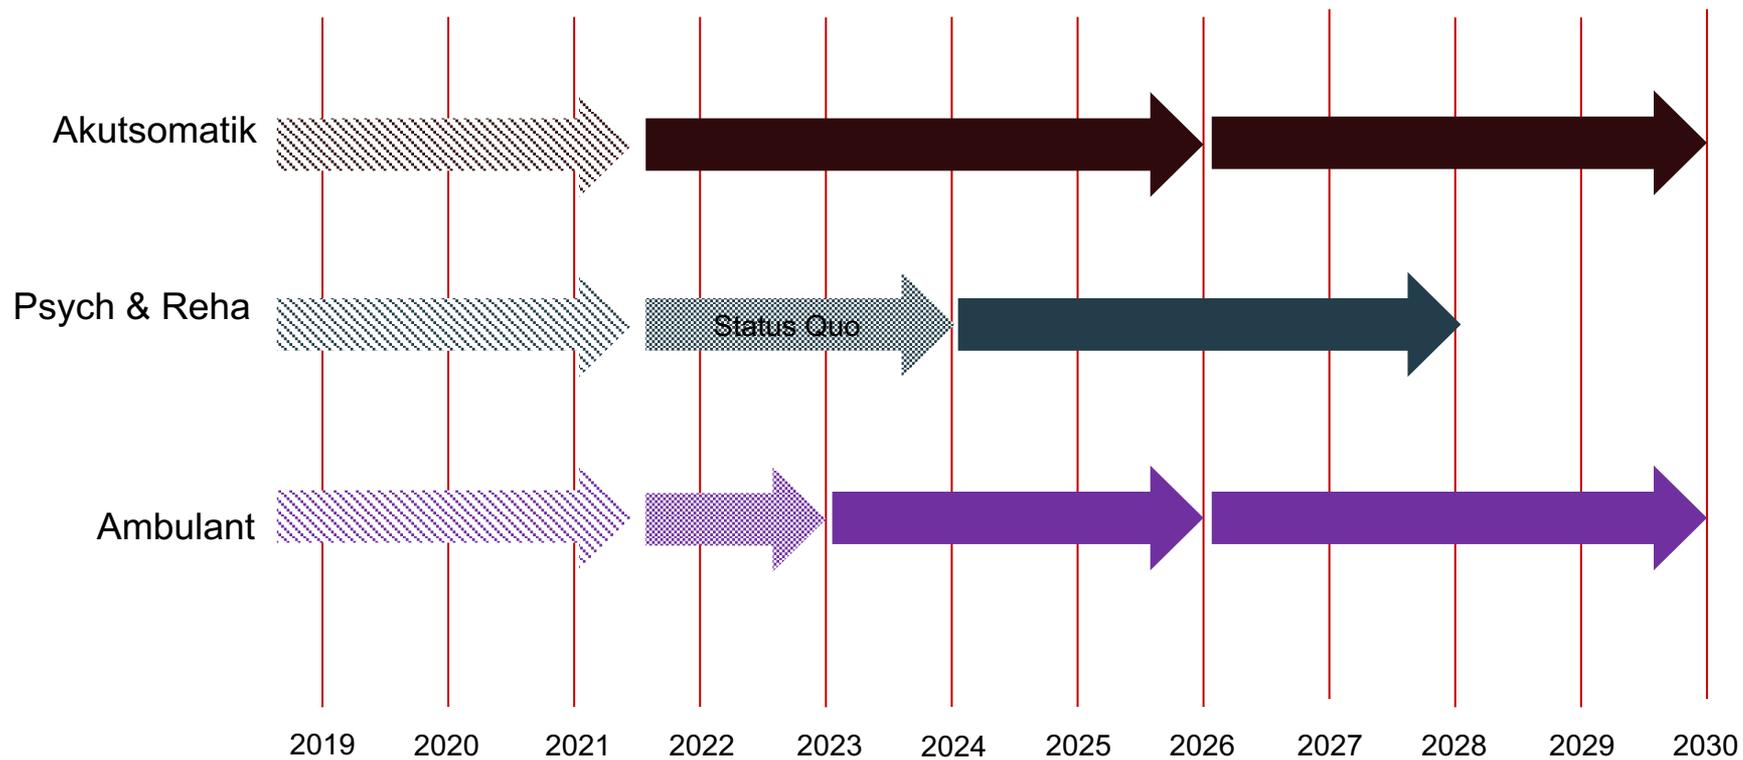

# I Projektaufbau Psychatriekonzept

## Einbettung Psychatriekonzeptes in das Projekt GGR

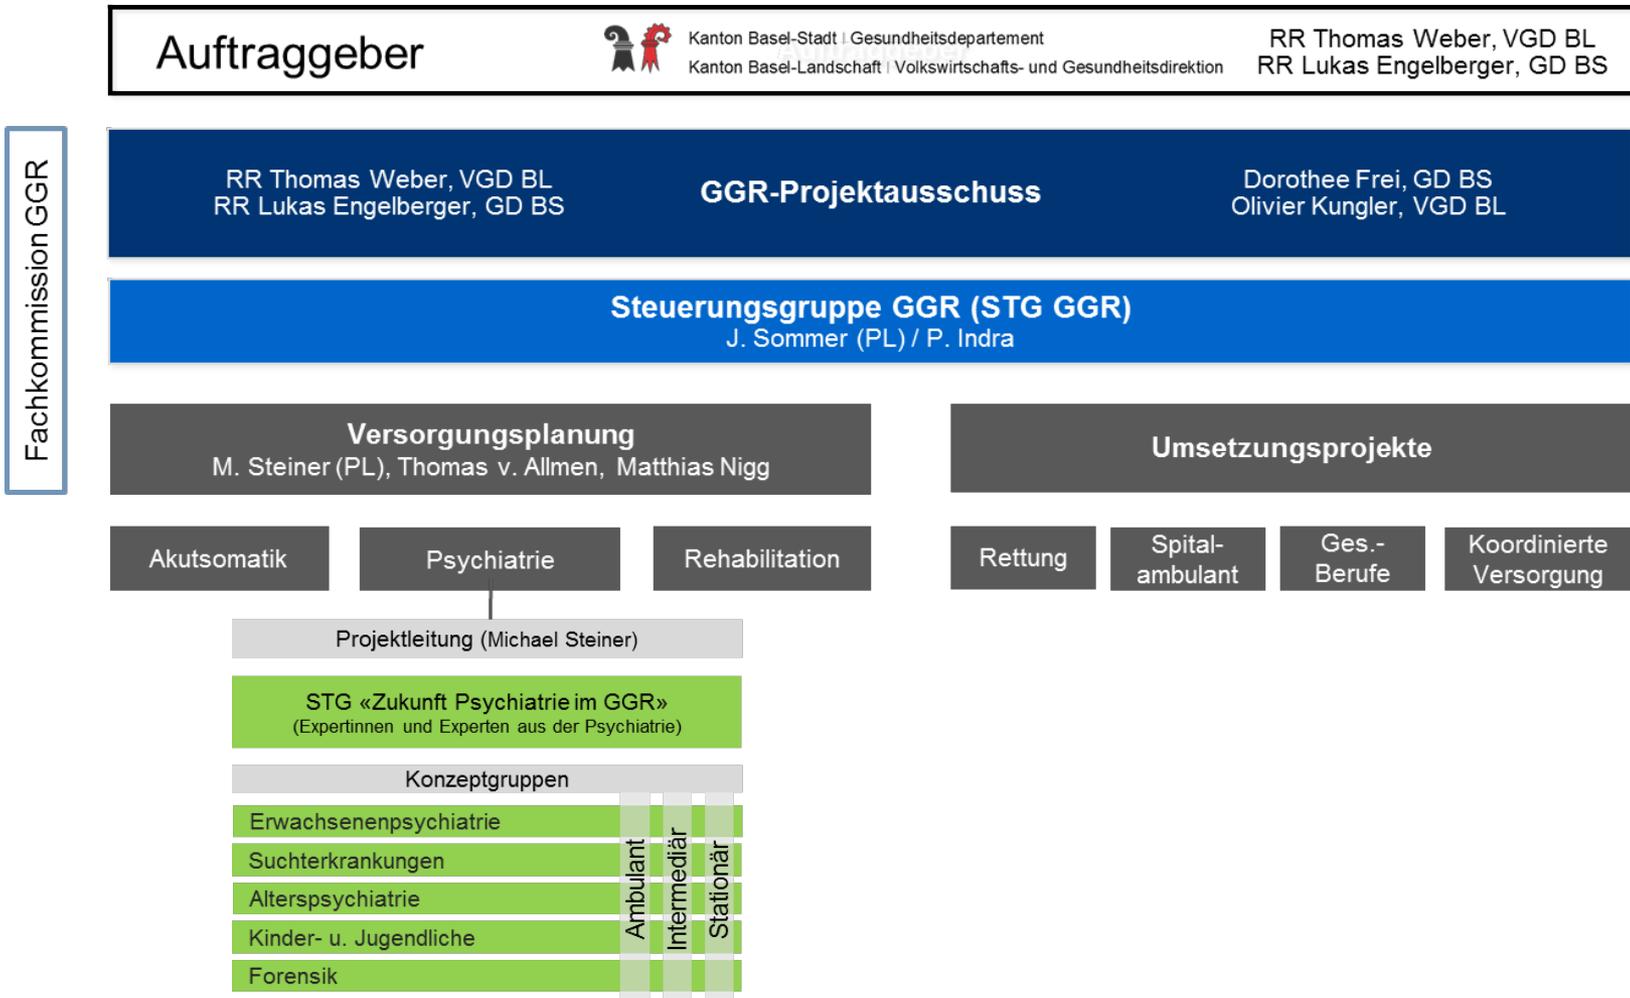

## I Projektaufbau Psychatriekonzept

# Erwartungen an ein Psychatriekonzept

- Gemeinsam getragene Grundhaltung der psychiatrischen Versorgung im GGR
- Berücksichtigung mittelfristiger Trends wie Ambulantisierung und Koordinierte Versorgung
- Überprüfung durch Realitäts-Check
- Veröffentlichung: mglw. mit Versorgungsplanungsbericht im September 2022

## Projektstruktur

- 5 Konzeptgruppen mit maximal 8 Fachexpertinnen und Experten
- Teilprojektleitung durch GGR-Team
- Steuerungsgruppe «Zukunft Psychiatrie»

# I Projektaufbau Psychiatriekonzept

## Die Expertinnen und Experten


STG «Zukunft Psychiatrie im GGR» (Expertinnen und Experten aus der Psychiatrie)		Projektleitung (Michael Steiner, GGR)
Matthias Jäger	PBL, Direktor Erwachsenenpsychiatrie	
Brigitte Contin	PBL, Direktorin Kinder- und Jugendpsychiatrie	
Carl Bohrmann	Fachgruppe BL (Frei praktizierende)	
Florence Kaeslin	VSP, Geschäftsführerin	
Matthias Nigg	Amt für Gesundheit BL	
Francisca Schiess	Zentrum Selbsthilfe beider Basel	
Dennis Bernoulli	Ausschuss PK BS, Fachgruppe Psychiatrie	
Marc Walter	Ausschuss PK BS, UPK	
Thomas Baumgartner	Ausschuss PK BS, Heilsarmee Basel	
Johannes Beck	Klinik Sonnenhalde	
Ulrike Kunz	Ausschuss PK BS, VPB, Kinder- und Jugendpsychiatrie	
Caroline Doka	Ausschuss PK BS, Angehörigenvertretung	
Thomas von Allmen	Gesundheitsdepartement BS	

Konzeptgruppen					
Erwachsenenpsychiatrie	Suchterkrankungen	Alterspsychiatrie	Kinder- u. Jugendliche	Forensik	
Daniel Sollberger	Klauspeter Stark	Silvia Tenés	Stefan Müller	Simone Hänggi	
Elena Seidel	Hans-Peter Engler	Stefan Otth	Ruth Meier	Sacha Aeschbach	
Matthias Wehrli	Joos Tarnutzer	Titus Natsch	Stefan Köhli	Marc Graf	
Markus Schlemmer	Martin Kofmel	Thomas Leyhe	Alain di Gallo	Birgit Meier	
Peter Schwob	Gerhard Wiesbeck	Käthy Papst	Rüdiger Fürstenau		
Marco Bachmann	Otto Schmid	Christoph Alber	Christina Stadler		
Undine Lang					
Andreas Schmidt					
Christoph Fenner					
Linda Greber	Regine Steinauer	Gabriele Marty	Irene Renz		

## II Gemeinsame Spitalliste «Psychiatrie»

# Erarbeitung gleichlautende Spitalliste «Psychiatrie»

Das Psychatriekonzept ist dem Planungsprozess vorgeschaltet.

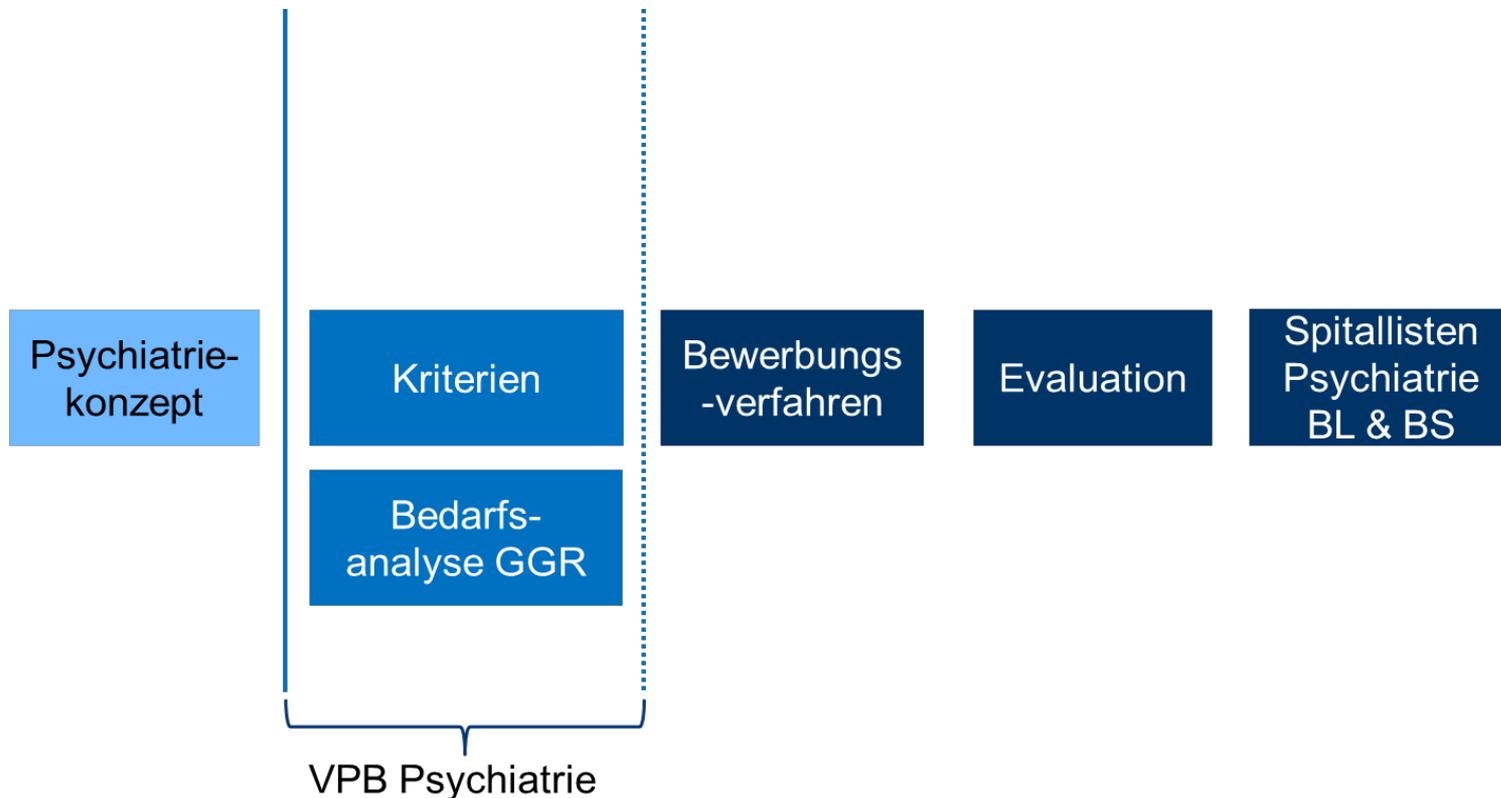

VPB = Versorgungsplanungsbericht

## II Gemeinsame Spitalliste «Psychiatrie»

### Konzeptgruppen

- Rekrutierung von regionaler Fachexpertise über Psych-Komm BS und Projektgruppe BL.
- Fachliches Fundament wird durch vorab zugestellte Fachliteratur sichergestellt.
- Sitzungsfrequenz durch Konzeptgruppen selbst zu bestimmen – verdichtet oder regelmässig; Sitzungsumfang ca. 2-3 Stunden.

### Steuerungsgruppe «Zukunft Psychiatrie im GGR»

- Aufgaben:
  - Sicherstellen, dass die Konzepte auf «gleiche Flughöhe» sind
  - Konzepte dem Realitäts-Check unterziehen (in 2021)
  - Schnittstellen zu anderen Konzepten herstellen (in 2021)
  - Konzeptionellen Überbau der psychiatrischen Versorgung in der Region schaffen (in 2021).

### Zeitplanung

- Projektstart: I. Quartal 2020
- Vorlage Konzeptentwürfe: I. Quartal 2021
- Zusammenführung Einzelkonzept durch Steuerungsgruppe: I. Quartal 2022

## II Gemeinsame Spitalliste «Psychiatrie»

# Lieferergebnis der Konzeptgruppen

- 10 bis 15seitige Trendbeschreibung zum jeweiligen Themenschwerpunkt
- Mögliche Gliederung:
  1. Abgrenzung / Schnittstellen zu anderen Bereich                      2 Seiten
  2. Wo geht es hin (Trends)    10 Seiten
    - a. Demografische Trends (gibt es demografische Trends, die Auswirkungen auf die Inanspruchnahme haben?)
    - b. Sozioökonomische Trends (neue Vergütungsformen, Einkommen, Bildung!, Entstigmatisierung, Arbeitswelten, Eingliederung ins Erwerbsleben, Sicherung der Selbstbestimmung im Alter, ...)
    - c. Trends
      - i. in der Behandlung bspw. Ambulantisierung, Wegfall von Behandlungsnotwendigkeiten, Digitalisierung, Prävention, Medikamente
      - ii. zu neue Krankheitsbildern, Schweregraden
  3. Konsequenzen für die Versorgung im GGR                              2 Seiten

### III Projektplan

## Erarbeitung eines Psychiatriekonzeptes für den GGR

IV. Q  
'20  
bis  
IV. Q  
'21

- Ausarbeitung Psychiatriekonzept
  - Erarbeitung Teilkonzepte (ab September 2020)
  - Erarbeitung Rahmenkonzept (ab September 2020)
  - Bewertung Entwürfe / Realitäts-Check durch Steuerungsgruppe (II. Q '21)
  - Fertigstellung Teil- und Rahmenkonzept (IV. Q '21)

I. Q '22  
bis III.  
Q'22

- Erstellung und Verabschiedung Psychiatriekonzept
  - Fertigstellung Entwurf (I. Q. 22); Endversion (III. Q. 22)
  - Redaktionelle Überarbeitung Psychiatriekonzept (III Q '22)
  - Diskussion Psychiatriekonzept GGR in Gremien (II.Q. 22)
  - Version für breite Öffentlichkeit (Kurzfassung) (III. Q. 22)

Parallel zum Psychiatriekonzept wird der Versorgungsplanungsbericht «Psychiatrie & Rehabilitation» ab dem Q. 2 '21 erstellt. Die Bedarfsanalyse wird auf Grundlage der 2018er Daten nach den Sommerferien 2020 vorbereitet und im FJ 2021 mit der Datengrundlage 2019 aktualisiert (erneute Aktualisierung FJ 2022 ist unrealistisch).


Start Bewerbungsverfahren, Erstellung der Spitalliste ab Oktober 2022 (formaler Prozess 9 Monate).



### III Projektplan

# Projektorganisation

## Projektplan 2021 – Phase 2

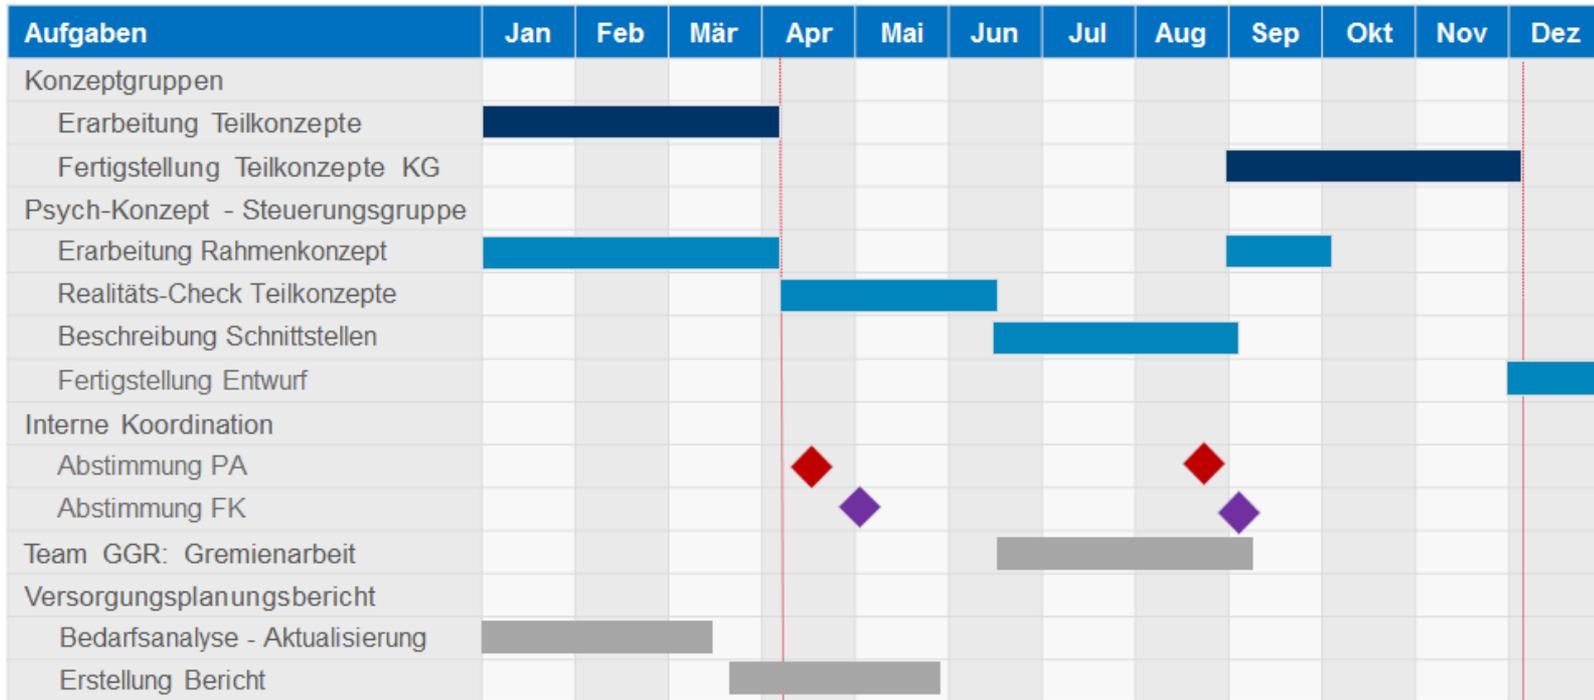

April


Teilkonzepte und Rahmenkonzept liegen im Entwurf vor.

Dez.

Teilkonzepte und Rahmenkonzept sind fertiggestellt.

# Erarbeitung eines Psychiatriekonzeptes für den GGR

## Projektplan 2022 – Phase 3

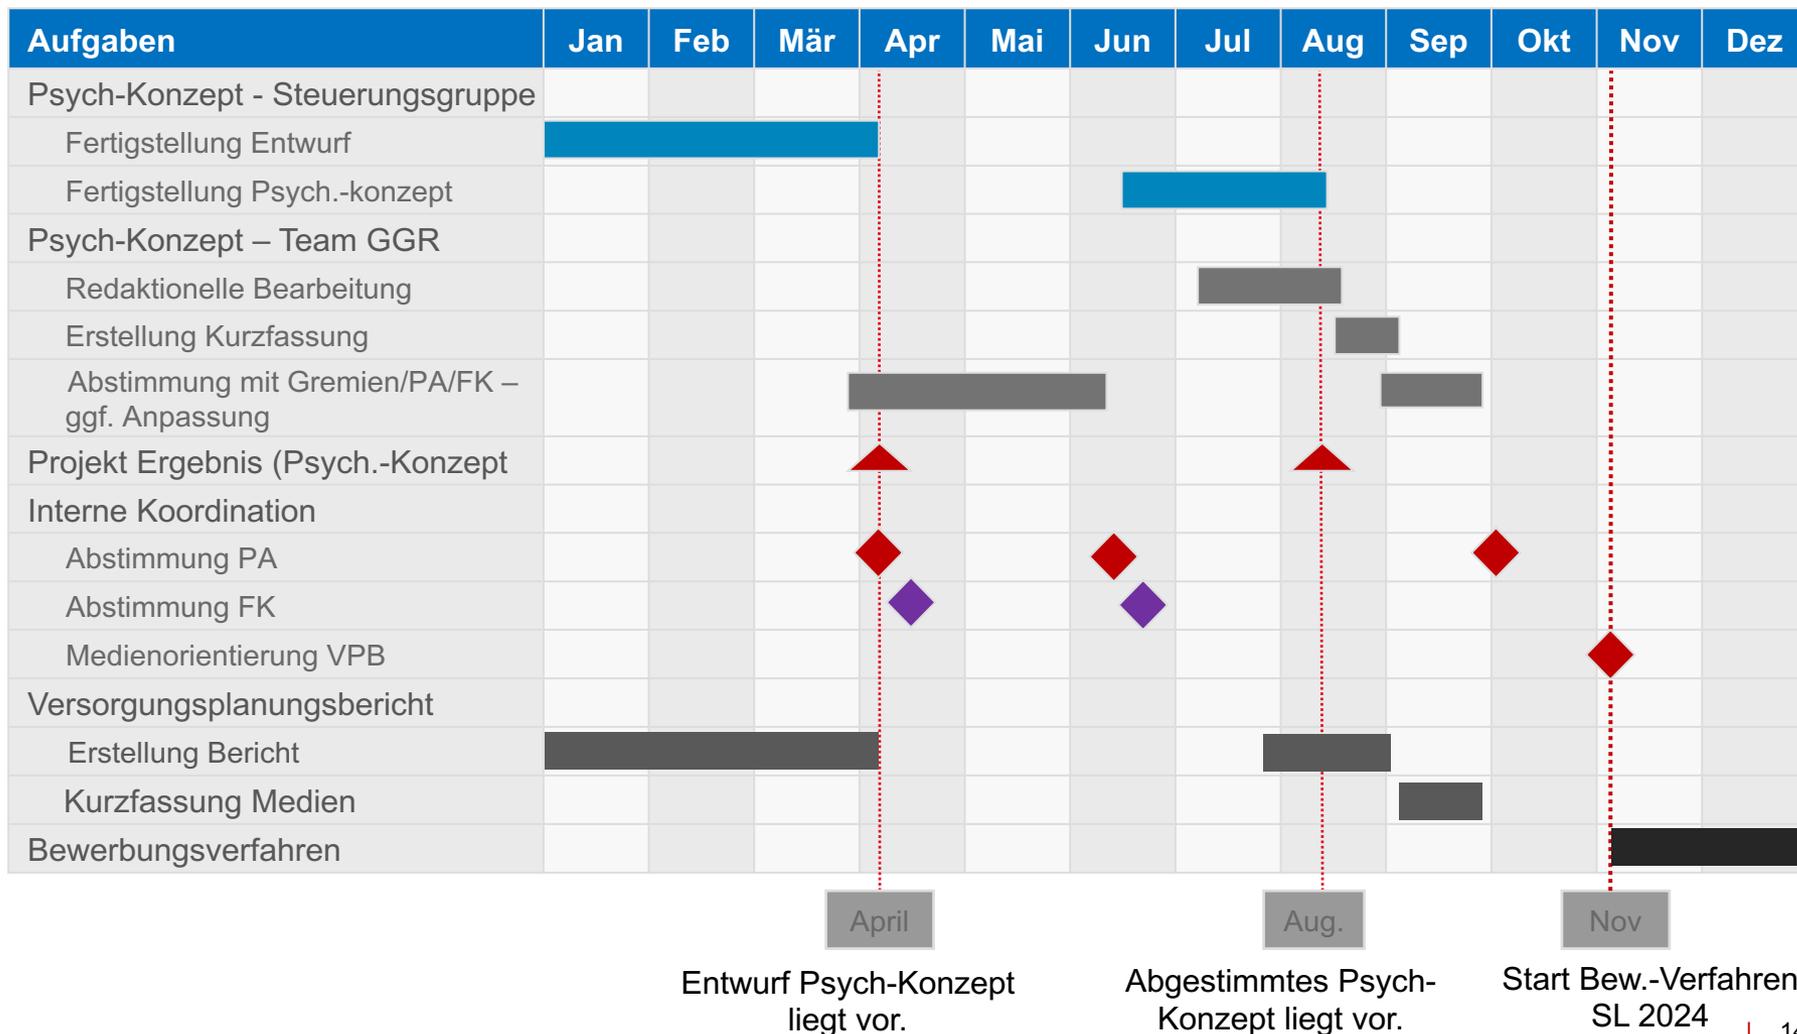

### III Aktueller Stand

## Aktueller Arbeitsstand Psychiatriekonzept

Erste Sitzung der Steuerungsgruppe fand am 7. September 2020 statt.

### Konzeptgruppen

Gremium	Stand	Nächster Termin
Steuerungsgruppe	Kick-off terminiert	07.09.2020 (verlegt vom März)
Konzeptgruppe Erwachsene	Kick-off + 2 Arbeitssitzungen durchgeführt	04.09.2020
Konzeptgruppe Sucht	Kick-off (Mrz) + 1 Arbeitssitzung durchgeführt	11.09.2020
Konzeptgruppe Alter	Kick-off terminiert	18.09.2020
Konzeptgruppe Kinder	Kick-off wird terminiert	Oktober
Konzeptgruppe Forensik	Kick-off wird terminiert	Oktober



Projekt ist planmässig gestartet.

## IV Fazit

### Fazit

- Projekt Psychiatriekonzept wurde wieder aufgenommen und ist im Plan;
  - Konzeptgruppen sind in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs; aber auch im Terminplan;
  - Steuerungsgruppe sieht Terminplanung für Erarbeitung des Psychiatriekonzeptes und mögliche Umsetzung in die Spitalplanung als realistisch an;
  - Erarbeitung der Datenbasis wurde mit Statistischem Amt Basel-Stadt initiiert;
- 
- Erarbeitung des Psychiatriekonzeptes ist auf Kurs!



# Fragen und Diskussion
